



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Fișa descriptivă contract SM-CL-05

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Arduș**
- Obiective:

Obiectul acestui Contract cuprinde proiectarea, obținerea avizelor, acordurilor, a Autorizației de Construire, construirea, punerea în funcțiune, testarea și operarea, până la emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, iar apoi remedierea posibilelor defecte la toate facilitățile din cadrul stației de epurare noi Tășnad și Arduș, astfel încât calitatea apei tratate să fie în conformitate cu cerințele stipulate în Directiva 91/272/CEE pentru zone sensibile. Nămolul generat în stația de epurare - în urma stabilizării și deshidratării - trebuie să fie adecvat pentru mai multe opțiuni de evacuare. Ca și cerință, vor fi luate în considerare limitele indicate pentru evacuarea nămolului în agricultură conform Directivei 86/278 CEE, OM 344/2004 (Departamentul Român de Mediu), reglementările privind depozitarea la groapa de gunoi și orice alte reglementări românești din domeniu.
- Lucrările vor consta în:
 - Realizarea tuturor sistemelor de conducte de apă potabilă, apă tehnologică, canalizare, apă uzată, nămol, aer, agent termic etc, necesare pentru interconectarea tuturor obiectivelor, în vederea unei funcționări corespunzătoare a proceselor de epurare;
 - Realizarea laboratorului stației de epurare și a clădirii administrative;
 - Asigurarea unui sistem corespunzător de alimentare cu energie electrică pentru toate obiectivele și echipamentele stației noi de epurare, precum și asigurarea celorlalte utilități;
 - Asigurarea unui sistem de automatizare și SCADA, realizarea de construcții și sisteme auxiliare;
 - Demolarea/dezafectarea/demontarea obiectivelor stației de epurare existente;
 - Transportul și depozitarea deșeurilor rezultate.

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 6460/2013
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Arduș**
- Valoarea contractului: 19.111.315,72 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 17.05.2013
- Data începerii lucrărilor: 01.07.2013
- Data finalizării lucrărilor: 06.07.2016
- Durata contractului: 33 luni (21 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 462 zile conform Actelor adiționale nr. 8 și 11 la Contract.
- Contractor: Asocieria S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - STULZ PLANAQUA GmbH
- Stadiul de implementare:
 - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 08.07.2013;
 - Proiectul tehnologic (revizia 1) a fost aprobat de către Inginer în data de 12.09.2013;



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- S-au obținut: **Autorizația de Construire nr. 029/21.08.2013** pentru organizarea de șantier de la stația de epurare a apelor uzate (SEAU) din orașul Arduș, respectiv **Autorizația de Construire nr. 34/23.08.2013** pentru organizarea de șantier de la stația de epurare a apelor uzate (SEAU) din orașul Tășnad;
- S-au obținut: **Autorizația de Demolare nr. 30/05.09.2013** pentru executarea lucrărilor de demolare/desființare a obiectivelor nefuncționale propuse pentru demolare la SEAU Arduș, respectiv **Autorizația de Desființare nr. 37/09.09.2013** pentru executarea lucrărilor de demolare/desființare a obiectivelor nefuncționale propuse pentru demolare la SEAU Tășnad;
- S-au obținut **Autorizația de Construire nr. 002/24.01.2014** pentru executarea lucrărilor de la SEAU Arduș, respectiv **Autorizația de Construire nr. 3/23.01.2014** pentru executarea lucrărilor de la SEAU Tășnad;
- În luna septembrie 2013 Antreprenorul a finalizat lucrările aferente organizării de șantier atât la SEAU Arduș cât și la SEAU Tășnad.

Contractul a fost făcut.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
Stadiul fizic faza 1- 100%
Stadiul financiar faza 1- 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020:
Stadiul fizic faza 2 - 47,5%
Stadiul financiar faza 2 - 24,43%

Contractul nr. 6460/17.05.2013 s-a reziliat din data de 17.01.2017.

În vederea finalizării lucrărilor rămase de executat la cele două stații de epurare (lucrări de construcții, lucrări la instalații mecanice, lucrări SCADA, lucrări la instalații electrice, lucrări de aducere în parametri, lucrări la sistemul de ventilație și încălzire), APASERV a demarat procedura de achiziție pentru lucrările neterminate rămase de executat, ce a fost finalizată în luna octombrie 2019. Astfel, Contractul de Lucrări nr. 316/14.10.2019 a fost semnat cu Asocieria PRO DIMENSION CONTRACTS S.R.L. - XALLO TEHNIC S.R.L.

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 316/14.10.2019
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud - terminarea lucrarilor (TL SM-CL-05)**
- Valoarea contractului: 9.458.061 lei (fără TVA).
- Data semnării contractului: 14.10.2019
- Data începerii lucrărilor: 08.11.2019
- Data finalizării lucrărilor: 08.01.2021
- Durata contractului: 14 luni. Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 61 zile conform Actului adițional nr. 2 la Contract, până în 10.03.2021.
- Contractor: Asocieria PRO DIMENSION CONTRACTS S.R.L. - XALLO TEHNIC S.R.L.
- Stadiul de implementare:
 - S-au obținut Autorizația de Construire nr. 14/18.02.2020 (SEAU Tășnad) - valabil: 24 luni, respectiv Autorizația de Construire nr. 11/06.02.2020 (SEAU Ardud) - valabil: 24 luni;
 - În data de 19.05.2020 au fost aprobate proiectele tehnice și au fost avizate de către verificatorii de specialitate;
 - Se lucrează la pavilioanele administrative și la instalațiile electrice de la SEAU Ardud, la finisaje obiective 4,7,11 din Ardud.
 - Progres fizic contract: 10%
 - Progres financiar contract: 0%

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD




Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE TĂȘNAD



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE TĂȘNAD

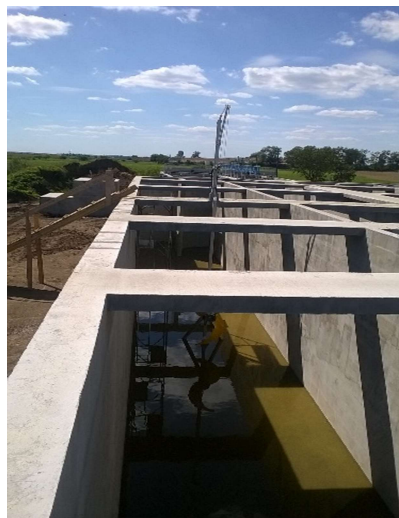

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE TĂȘNAD (Contract nr. 316/14.10.2019)



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD (Contract nr. 316/14.10.2019)



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE ARDUD (Contract nr. 316/14.10.2019)

