

Fișa descriptivă contract SM-CL-14

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada**
- Obiective:
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Livada la sistemul de alimentare cu apă potabilă prin extinderea rețelelor de apă
 - Reducerea pierderilor de apă și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în localitatea Livada
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Livada la sistemul de canalizare prin extinderea rețelelor de canalizare
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață, și diminuarea riscurilor de îmbolnăvire prin extinderea rețelei de canalizare pentru populația deservită în orașul Livada
 - Monitorizarea consumului de apă prin creșterea numărului de locuințe branșate la rețeaua de apă, creșterea cotei de racordare a locuințelor la rețeaua de canalizare menajeră din localitatea Livada
- Lucrările vor consta în:
 - Rețele de apă**
 - Extinderea rețelor de apă cu aproximativ 18,4 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Livada			
Nr. crt.	Strada	EXTINDERE	
		Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Salcânilor	974,17	110
2	Ady Endre	500,20	110
3	Satu Mare	1.823,11	160
4	Oașului	1.334,03	160
5	Teilor	1.063,65	160
6	Zorilor	477,62	110
7	Avântului	423,09	110
8	Tineretului	1.114,22	110
9	Trandafirilor	244,89	110
10	Rândunelelor	762,37	110
11	G. Coșbuc	278,25	110
12	16 Februarie	408,81	110
13	Albinei	1.163,30	110
14	Kossuth L.	654,37	110
15	09.Mai	619,59	110
16	Ghioceilor	341,67	110

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Livada			
17	Crinilor	305,84	110
18	Lalelelor	344,55	110
19	Scânteii	2.267,19	110
20	T. Vladimirescu	1.085,55	110
21	N. Bălcescu	1.026,56	110
22	Laar V II	296,91	110
23	Baia Mare	586,68	110
24	Gara Mare	339,37	110
25	Viitorului I	16,38	110
TOTAL EXTINDERE		18.452,37	

Rețele de canalizare

- Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 12,4 km

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Livada			
Nr. crt.	Strada	EXTINDERE	
		Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Salcânilor	753.53	250.00
2	Ady Endre	546.28	250.00
3	Satu Mare	824.15	250.00
4	Oașului	283.17	250.00
5	Teilor	832.64	250.00
6	Zorilor	476.38	250.00
7	Avântului	436.39	250.00
8	Tineretului	663.78	250.00
9	Trandafirilor	237.78	250.00
10	Rândunelelor	662.20	250.00
11	G. Coșbuc	269.50	250.00
12	16 Februarie	385.29	250.00
13	Albinei	1,150.15	250.00
14	Kossuth L.	658.89	250.00
15	09.Mai	625.78	250.00
16	Ghiocilor	338.49	250.00
17	Crinilor	309.90	250.00
18	Scânteii	119.09	250.00
19	T. Vladimirescu	1,093.41	250.00
20	N. Bălcescu	1,020.02	250.00
21	Gara Mare	354.60	250.00
22	Viitorului I	215.67	250.00
23	Viitorului II	200.22	250.00
24	Baia Mare	0.00	În P.T. s-a prevăzut

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în orașul Livada			
			canalizare sub presiune.
25	Laar V.II	0.00	Există canalizare pe stradă.
	TOTAL EXTINDERE	12.457,31	

Stații de pompare ape uzate

- Construirea a 4 stații de pompare a apelor uzate
- Construirea a aproximativ 1 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 304 / 13.10.2014
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada**
- Valoarea contractului: 15.919.510,21 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 13.10.2014
- Data începerii lucrărilor: 05.12.2014
- Data finalizării lucrărilor: 20.04.2016
- Durata contractului: 29 luni (17 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost redusă cu 5 luni conform Actului adițional nr. 1 la Contract. Durata de execuție a lucrarilor s-a prelungit cu 127 zile conform Actului adițional nr. 3 la Contract.
- Contractor: S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.
- Stadiul de implementare:
 - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 51/03.11.2014** pentru executarea lucrărilor
 - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Apă potabilă		
Extindere rețele de distribuție	km	18,5
Apă uzată		
Extindere rețele de canalizare	km	12,5
Stații noi de pompare a apei uzate	buc	4
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	0,7


- Lucrările au fost recepționate în data de 31.01.2017.
- În data de 09.02.2018 s-au emis Procesele Verbale de Recepție a Punerii de Funcțiune, de Recepție Finală și de Recepție Definitivă, conform prevederilor HG 273/1994 și HG 51/1996.
- Progres fizic: **100%**
- Progres financiar: **100%**

Contractul a fost făcut.

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- FAZA 1 cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
Stadiul fizic faza 1 - 100%
Stadiul financiar faza 1 - 100%
- FAZA 2 cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020:
Stadiul fizic faza 2 - 100%
Stadiul financiar faza 2 - 100%

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Livada

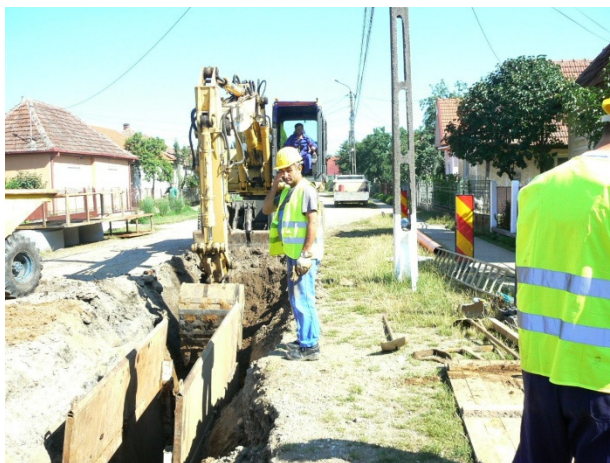

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Livada

