

Fișa descriptivă contract SM-CL-07

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare**
- Obiective:
 - Reducerea pierderilor de apă, prin monitorizarea consumului și înlocuirea conductelor îmbătrânite
 - Întărirea capacității de preluare a apelor uzate - ceea ce facilitează racordarea de noi utilizatori, inclusiv prin conectarea localităților adiacente la sistem
 - Reducerea infiltrațiilor în sistemul de canalizare cu diminuarea costurilor de epurare, prin reabilitarea sistemului de canalizare existent în municipiul Satu Mare
- Lucrările vor consta în:
 - Reabilitarea a aproximativ 8 km rețele de apă
 - Reabilitarea și extinderea a aproximativ 15 km rețele de canalizare

Lista cantitativă pe străzi a rețelor de apă în municipiul Satu Mare

Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Str. Făgărașului	81,05	110
2	Str. Ganea (CU2)	85,07	160
3	Str. Ganea (CU22 - CG20)	243,33	160
4	Str. Ganea (CG1 - CG5)	71,19	110
5	Str. Fântânele (CB3 - CF35 - CF33)	84,68	110
6	Str. Fântânele (CB3 - CF2)	534,30	160
7	Str. Alecu Russo (CR20 - CR26)	71,28	200
8	Str. Bârgăului + Str. Cibirului (CB3 - CE10)	217,97	160
9	Str. Cibirului (CE12)	131,89	160
10	Str. Bârgăului (CB9 - CH10)	209,38	160
11	Str. Bârgăului (CU20 - CG20)	116,89	160
12	Str. Codrului (CC1 - CC17)	349,09	160
13	Str. Ganea (CG9 - CG40)	265,22	160
14	Str. Dorna (CD9 - CF16)	239,35	160
15	Str. Alecu Russo (CU52)	185,56	200
16	Str. L. Blaga (CU2 - CU52)	689,89	200
17	Str. Jiului C.T.3	177,83	110
18	Str. Dariu Pop C.T.4	157,32	110
19	C.T.2 Micro 15 (T9)	433,91	110
20	C.T. Mal Stâng Someș	216,65	110
21	C.T.1 Micro 17	377,68	160
22	C.T.3 Micro 17	419,87	110
23	Str. 1 Decembrie 1918	376,3	110



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

24	Str. Magnoliei	210,45	110
25	Str. Wolfenbüttel	892,32	110
26	Str. Fabricii (+ trecere de cale ferată)	418,98	800
TOTAL		7.257,45	

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de canalizare în municipiul Satu Mare

Nr. crt.	Strada	Lungime (m)	Diametru (mm)
1	Str. Rodnei	924,97	1000
2	Str. Rosetti	781,16	1000
3	Str. Făgărașului	205,7	1400/2100
4	Str. Brândușa - Arinului	255,88	1000/1500
5	Str. Diana II	1.144,68	800
6	Str. Dara	964,68	600
7	Str. Poligonului	726,17	600
8	Str. Odobescu I	955,3	500
9	Str. Odobescu II	466,15	400
10	Str. Vasile Lucaciu	826,71	500
11	Str. Șețiu Ștefan	1.282,59	800
12	Str. Andron Ioniță	229,91	315
13	Str. Platanului	453,61	600
14	Dr. Carei I	891,75	400
15	Dr. Carei II	342,42	315
16	Str. Energiei	508,56	600
17	Str. Magnoliei I	877,83	400//500
18	Str. Magnoliei II	469,23	315
19	Str. Depozitelor I	836,99	500
20	Str. Depoziteor III	493,36	500
21	Str. Toamnei	427,78	400
22	Str. 1. Iunie	626,35	400
23	Str. Banat	259,63	400
TOTAL		14.951,41	

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 20319/30.12.2013
- Titlul contractului: **Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare**
- Valoarea contractului: 21.900.000,00 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 30.12.2013
- Data începerii lucrărilor: 14.02.2014
- Data finalizării lucrărilor: 08.05.2016

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

- Durata contractului: 27 luni (15 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor). Durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită cu 358 zile conform Actelor adiționale nr. 4, 6 și 7 la Contract.
- Contractor: Asocieria S.C. DEPONA EDILITARE ȘI COMERȚ S.R.L. - S.C. SILCOMPREST S.R.L. - ZEMPLÉNKŐ KELET MAGYARORSZÁGI ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ ÉS Bányászati KFT
- Stadiul de implementare:
 - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 24.02.2014;
 - Au fost aprobate de Inginer Garanția de bună execuție, Polițele de asigurare;
 - S-a obținut **Autorizația de Construire nr. 44/13.02.2014** pentru executarea lucrărilor.
 - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
Apă potabilă		
Reabilitare rețele de distribuție	km	7,3
Apă uzată		
Reabilitare rețele de canalizare	km	14,1

- Lucrările au fost recepționate în data de 22.12.2016.
- În data de 12.07.2018 a fost semnat și aprobat Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 34907.
- Progres fizic contract: **100%**
- Progres financiar contract: **100%**

Contractul a fost fazat.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
 - Stadiul fizic faza 1 - 100%
 - Stadiul financiar faza 1 - 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020:
 - Stadiul fizic faza 2 - 100%
 - Stadiul financiar faza 2 - 100%



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.




S.C. APASERV SATU MARE S.A.




Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare Drum Carei

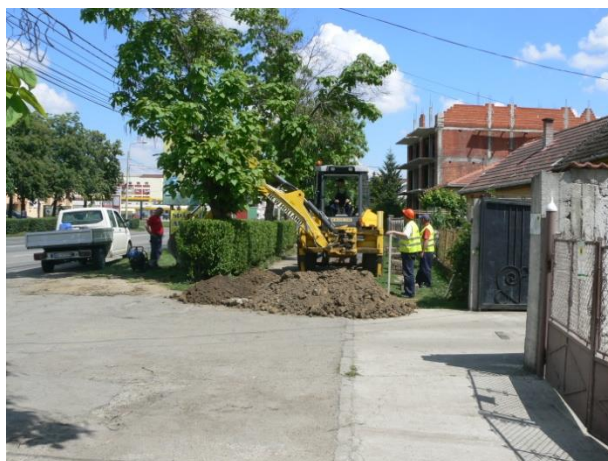

Str. Magnoliei

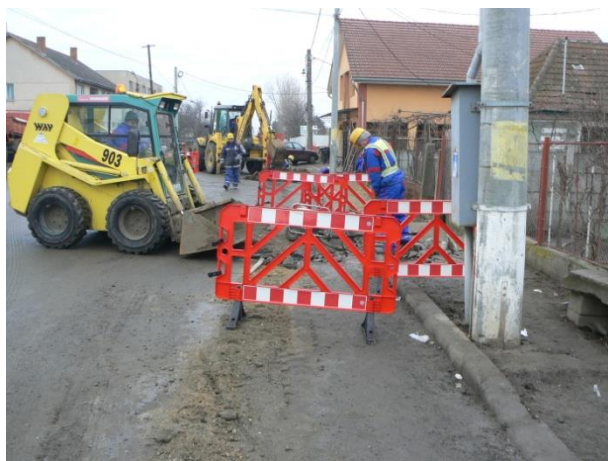

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare Str. Odobescu



Str. Ganea



Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Reabilitarea și extinderea rețelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare

Str. Ganea



Str. Toamnei





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

