

Fișa descriptivă contract SM-CL-15

PREZENTAREA PROIECTULUI/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Titlul contractului: **Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Arduș**
- Obiective:
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașul Tășnad la sistemul de alimentare cu apă potabilă prin extinderea și reabilitarea rețelelor de apă
 - Reducerea pierderilor prin monitorizarea consumului de apă și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în localitatea Tășnad
 - Creșterea gradului de conectare a populației din orașele Tășnad și Arduș (Mădăras) la sistemul de canalizare prin extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare
 - Reducerea riscului poluării apelor subterane și de suprafață
 - Diminuarea riscurilor de îmbolnăvire
- Lucrările vor consta în:

Tășnad

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 6,5 km
- Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă cu aproximativ 7 km
- Extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 17 km
- Reabilitarea rețelei de canalizare cu aproximativ 4,5 km
- Construirea a 5 stații de pompare a apelor uzate
- Construirea a 1,5 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Tășnad			
Nr. crt.	Strada	REȚEA DE APĂ	
		Lungime [m]	DN [mm]
		EXTINDERE	
		Lungime [m]	DN [mm]
1	Str. Stefan cel Mare-Blaja	3.074,48	110
2	Str. Înfrățirii - Tășnadu Nou	974,64	90
3	Str. Înfrățirii - Tășnadu Nou	2.228,17	110
4	Str. Cireșilor	278,82	110
	TOTAL EXTINDERE	6.556,11	
		REABILITARE	
5	Str. Ștefan cel Mare	800,00	110
6	Str. Lăcrămioarelor	798,49	110
		Lungime [m]	DN [mm]
7	Str. M.Sadoveanu	82,37	110
8	Str. Gh.Doja	527,54	110

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Tășnad			
Nr. crt.	Strada	REȚEA DE APĂ	
9	Str. M.Eminescu	166,60	110
10	Str. Zorilor	162,22	110
11	Str. Al. Constructorilor	150,51	110
12	Str. Salcânilor	356,59	110
13	Str. Spicului	407,84	110
14	Str. Trandafirilor	426,61	110
15	Str. Traian Vuia	156,76	110
16	Str. Garoafelor	281,33	110
17	Str. N.Bălcescu	108,13	110
18	Str. N.Iorga	270,45	110
19	Str. T.Vladimirescu	815,40	110
20	Str. Gării	450,81	110
21	Str. Crișan	708,40	110
	TOTAL REABILITARE	6.670,05	
	TOTAL EXTINDERE ȘI REABILITARE	13.226,16	

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Tășnad			
Nr. crt.	Strada	REȚEA DE CANALIZARE	
		EXTINDERE	
		Lungime [m]	DN [mm]
1	Str. Ștefan cel Mare	2.295,95	250
2	Str. Înfrățirii	433,41	250
3	Str. Cireșilor	301,60	250
4	Str. M.Sadoveanu	279,30	250
5	Str. Gh.Doja	543,36	250
6	Str. M.Eminescu	487,81	250
7	Str. Spicului	401,64	250
8	Str. Trandafirilor	787,28	250
9	Str. Traian Vuia	140,20	250
10	Str. Aleea Garoafelor	260,74	250
11	Str. N.Bălcescu	190,79	250
12	T.Vladimirescu	416,16	250
13	Str. Castanilor (inclusiv racordul la Str. Lăcrămioarelor)	504,14	250
Nr. crt.	Strada	REȚEA DE CANALIZARE	
		Lungime [m]	DN [mm]

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

14	Str. Nucilor	117,39	250
15	Str. Ștrandului	689,00	250
16	Str. Avram Iancu	1176,08	250
17	Str. Belșugului	525,57	250
18	Str. Biro Lajos	212,21	250
19	Str. Câmpului	503,48	250
20	Str. Crasnei	1313,04	250
21	Str. Crișan	705,65	250
22	Str. Florilor	406,94	250
23	Str. Livezilor	759,03	250
24	Str. Margaretelor	140,94	250
25	Str. Pertru Major	424,05	250
26	Str. Pompierilor	609,09	250
27	Str. Rozelor	364,62	250
28	Str. Teiului	378,11	250
29	Str. Viilor	298,84	250
30	Str. Viitorului	226,31	250
31	Lina de conectare la SP1	815,64	250
	TOTAL EXTINDERE	16.708,37	
		REABILITARE	
32	Colector 1 către SE Tășnad-REHA 1	714,33	400
33	Colector 1 la strada Vladimirescu-REHA 2	874,88	315
34	Colector 2 către SE Tășnad-REHA 3	442,20	315
35	Colector 2 la strada Înfrățirii-REHA 4	257,89	315
36	Colector 2 la strada Gării-REHA 5	2.157,69	315
	TOTAL REABILITARE	4.446,99	
	TOTAL EXTINDERE ȘI REABILITARE	21.155,36	

Ardud - (Mădăras)

- Extinderea rețelei de canalizare în lungime cu aproximativ 8 km
- Construirea a 3 stații de pompare a apelor uzate
- Construirea a 3 km conductă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a apelor uzate

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Ardud (Mădăras)			
Nr.	Strada	REȚEA DE CANALIZARE	
		Lungime [m]	DN [mm]
1	Str. Ardudului	3763,39	250

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lista cantitativă pe străzi a rețelelor de apă în orașul Arduț (Mădăras)			
Nr.	Strada	REȚEA DE CANALIZARE	
		Lungime [m]	DN [mm]
2	Str. Fericirii	392,06	250
3	Str. Gelu	2.463,36	250
4	Str. Ghirișa	839,77	250
5	Str. Sătmărel	841,49	250
TOTAL EXTINDERE		8.300,07	

STADIUL IMPLEMENTĂRII/ CONTRACT DE LUCRĂRI

- Contractul numărul: 149/22.05.2014
- Titlul contractului: **Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Arduț**
- Valoarea contractului: 21.570.334,91 lei (fără TVA)
- Data semnării contractului: 22.05.2014
- Data începerii lucrărilor: 30.06.2014
- Data finalizării lucrărilor: 30.10.2015
- Durata contractului: 28 luni (16 luni durata de execuție a lucrărilor și 12 luni perioada de notificare a defectelor)
- Contractor: Asocieria S.C. VERTA TEL S.R.L. - S.C. DANRUCOR S.R.L.
- Stadiul de implementare:
 - S-au obținut **Autorizația de Construire nr. 6/18.03.2014** pentru executarea lucrărilor de construire din orașul Tășnad și **Autorizația de Construire nr. 006/03.04.2014** pentru executarea lucrărilor de construire din orașul Arduț - localitatea Mădăras
 - Amplasamentul și bornele de reper au fost predate Antreprenorului în data de 04.08.2014 pentru orașul Arduț - localitatea Mădăras, respectiv în data de 07.08.2014 pentru orașul Tășnad;
 - Toate lucrările au fost finalizate, și anume:

Indicator	UM	Cantitate realizată
TĂȘNAD		
Apă potabilă		
Extindere rețele de distribuție	km	6,6
Reabilitare rețele de distribuție	km	6,6
Apă uzată		
Extindere rețele de canalizare	km	16,1
Reabilitare rețele de canalizare	km	4,5
Stații noi de pompare a apei uzate	buc	5
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	1,5

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare


ARDUD (MĂDĂRAS)		
Apă uzată		
Extindere rețele de canalizare	km	8,3
Stații noi de pompare a apei uzate	buc	3
Construire conducte sub presiune aferente stațiilor de pompare	km	3,3

- Lucrările au fost recepționate în data de 26.04.2018. Lucrările executate sunt în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție).
- Progres fizic contract: **100%**
- Progres financiar contract: **87,50%**

Contractul a fost fazat.

- **FAZA 1** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial "Mediu" (POS Mediu) 2007-2013:
Stadiul fizic faza 1 - 100%
Stadiul financiar faza 1 - 100%
- **FAZA 2** cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 -2020:
Stadiul fizic faza 2 - 100%
Stadiul financiar faza 2 - 88,92%

Lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Ardud (Mădăras)

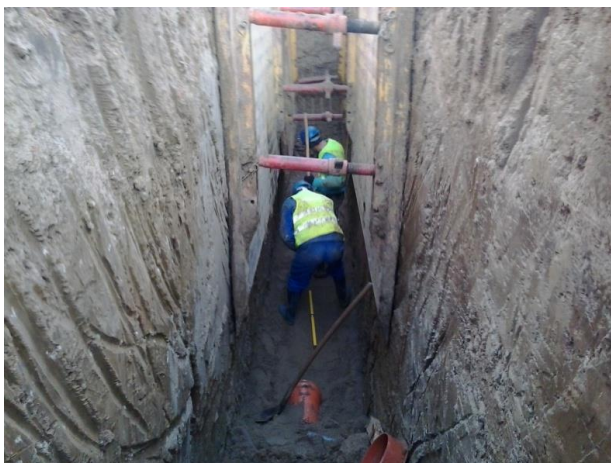



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad



0



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investim în mediu. Credem în viitor.



S.C. APASERV SATU MARE S.A.



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare

Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad

